



चन्द्रकोट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या : ०७९/०८०

चलानी नं. : ६२

शान्तिपुर गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

मिति : २०७९/५/१

श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग

श्रीमहल, पुलचोक, ललितपुर

विषय:- प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको प.स:- २०७९/८० च.नं १ मिति २०७९/४/२५ गतेको पत्रानुसार स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनको प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्बन्धी माग भई आएको हुदाँ यस चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत Construction Of Rural Municipal Building, Chandrakot Rural Municipality-4, Shantipur को मिति २०७८/०९/११ गते यस कार्यालय र स्वच्छन्द-सुशन-लर्ड बुद्ध बिच मु.अ.कर बाहेकको रकम रु ५८,३९२,९४३.८६/- (अक्षरूपी पाँच करोड त्रियासी लाख बयानब्बे हजार नौ सय त्रिचालिस रुपैया छयासी पैसा मात्र) मा सम्झौता भइ निर्माण कार्य भइरहेको र उक्त भवनको प्रगति विवरण तथा आ.व २०७९/८० का लागि थप आवश्यक पर्ने बजेट यसै पत्रसाथ संलग्न गरि पठाईएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

(इन्द्र बहादुर खत्री)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण ढाँचा

ब.उ.शि.नः

३६५०११११

प्रगति विवरण पेश गरेको मिति:-

२०७९/५/१

१ स्थानीय तहको नाम:- चन्द्रकोट गाउँपालिका

२ स्थानीय तहको कोड:- ८०१०५५२०६

३ जिल्ला:- सुनमी

४ लागत अनुमान(र.)- १२२,१५६,७६४.३८

५ प्रशासकीय भवन निर्माणको हालसम्मको प्रगति:-

६ निर्माण व्यवसायीको नाम, ठेगाना:- श्री स्वच्छन्द-सुशान-लर्ड बुद्ध बे. मि. ललितपुर

७ ठेक्काको सुरु सम्झौता रकम (र.)- ६७,९२९,६७६.३८

८ भेरीएसन भएको भए सो सहितको संझौता रकम (र.)-

९ सम्झौता मिति:- २०७८/९/११

१० सम्पन्न हुने मिति:- २०८१/५/११

११ म्याद थप सहित सम्पन्न हुने मिति:-

१२ प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि हालसम्म विनियोजित रकम र खर्च विवरण (श्रोतका आधारमा)

(रकम र. हजारमा)

आ.व.	रा.यो.आ.		प्रदेश		जि.स.स.		संघ (स्थानीय पूर्वाधार विभाग)		स्थानीय तह		कुल जम्मा	
	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च
२०७६-७७												
२०७७-७८												
२०७८-७९							१०,०००	१०,०००	६,०००	५,८६०	१६,०००	१५,८६०
२०७९-८०									१०,०००		१०,०००	
जम्मा											२६,०००	१५,८६०

१५,८६०,०००

२३.३५%

५.८९%

२५,०००,०००

१५,०००,०००


नहुने


२०% पेशी खर्च रहेको

नोट:-

१. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यको हालसम्मको प्रगति (जग्गा प्राप्ति/डिपिआर तयारी/Partial Tendering/ ठेक्का आव्हान भईसकेको/ ठेक्का सम्झौता भएको/ निर्माणधिन/सम्पन्न) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुहुन।
२. आंशिक ठेक्का (Partial Tendering) आव्हान गरेका स्थानीय तहहरूले अनिवार्य रूपमा हालसम्म लगाईएका ठेक्काहरूको विवरण (सम्झौता रकम, बजेट श्रोत, खर्च विवरण लगायत) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुहुन।
३. निर्माणधिन रहेका आयोजनाहरूको हकमा, निर्माणधिन भवनको हालसालै खिचिएका फोटोहरू अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुहुन।
४. फारममा उल्लिखित सम्पूर्ण विवरण पछिसम्म फरक नपर्ने गरी भर्नुपर्नेछ।
५. उल्लिखित विवरणका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिने हुँदा विवरण फरक परेको खण्डमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनेछ।



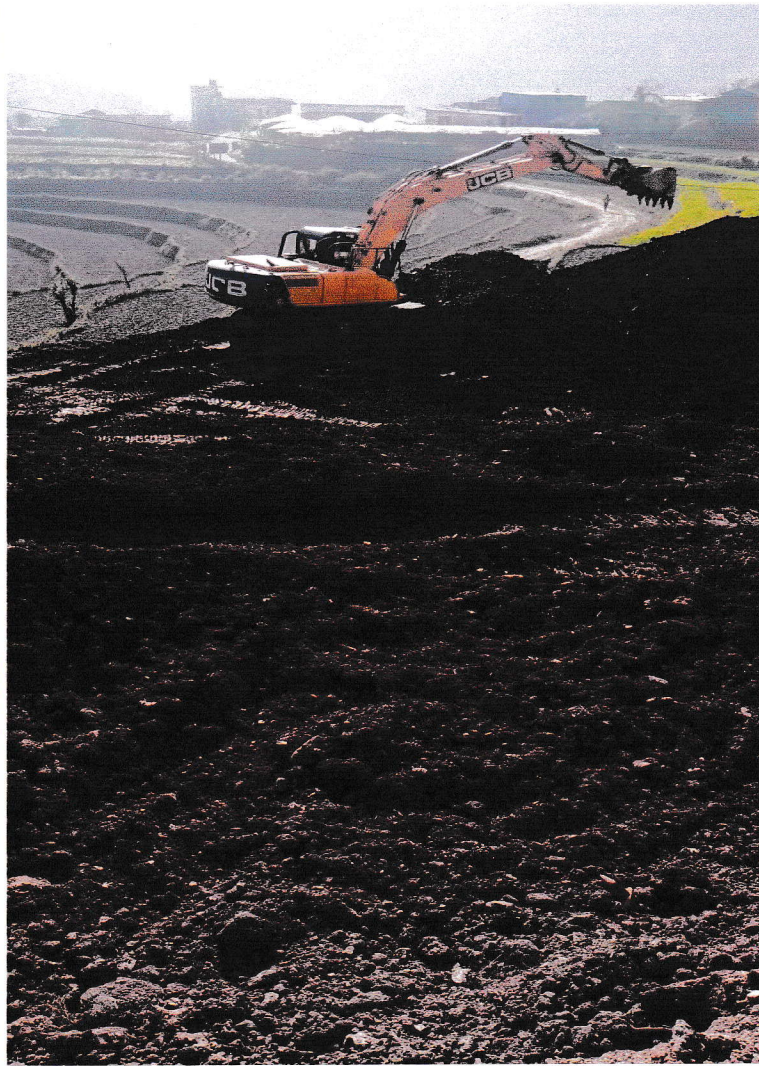

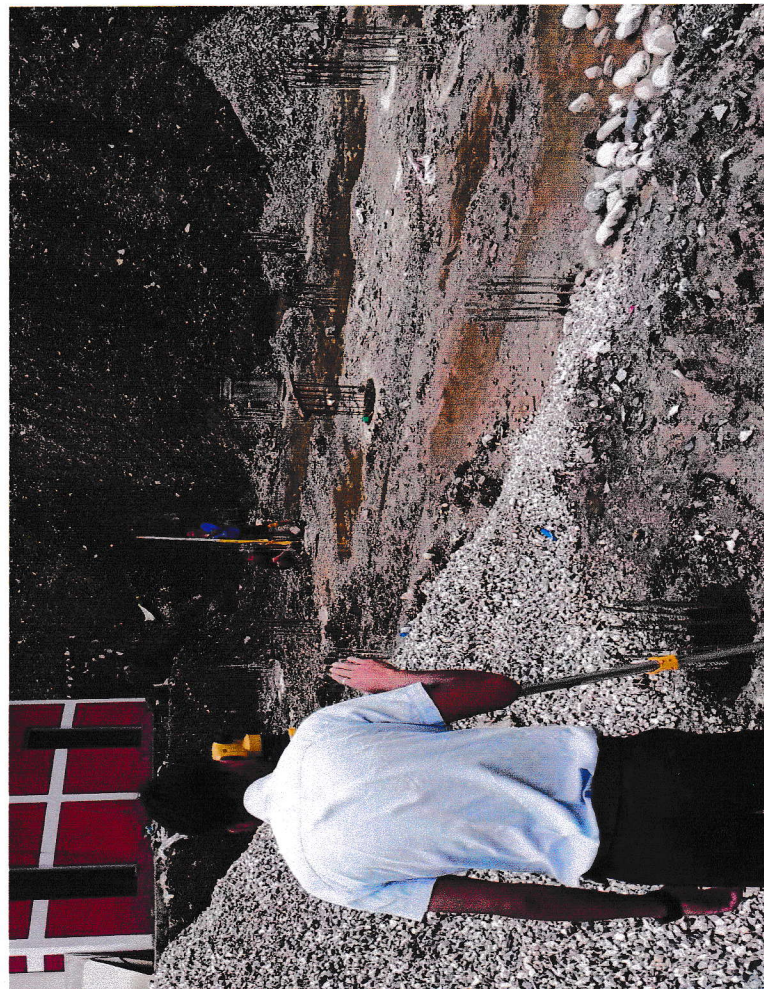



चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या: ०७९/०८०

चलानी नं. ९४८०


चन्द्रकोट गाउँपालिका
शासकिय अधिकारी, मुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८०/०९/११

श्री आर्थिक मामिला मन्त्रालय
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल

विषय: विवरण पठाईएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपालको पत्र संख्या ०७९/०८० च.नं. ७६८ मिति २०७९/१२/२१ गतेको प्राप्त पत्र बमोजिम सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदान अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण पठाउन आदेश भए बमोजिम यसै पत्र साथ प्रगति विवरण पाना २(दुई) संलग्न गरि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ।


.....
(विष्णु प्रसाद भुसाल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विष्णु प्रसाद भुसाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(क) समपूरक अनुदान

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल लागत	ठेक्का सम्झौता भएको रकम (बहुवर्षिय आयोजनाको हकमा चालु आ.व.को दायित्व मात्र)	हालसम्म आयोजना कार्यक्रमको प्रगति		कैफियत
				भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति रु.	
१.	मजुवा शान्तिपुर नालि निर्माण कार्य	४८५७८४८	३९८६६५९	७०		
२.	शान्तिपुर टिमुरे सडक स्तरउन्नति तथा ड्रेन निर्माण ४	४८४६४९८	३३६८७७२	१००	३३६८७७२	
३.	शान्तिपुर हस्पिटल लाइन सडक स्तरउन्नति तथा ड्रेन निर्माण कार्य ६	४८५५७५०	३०२४६६६.९०	१००	३०२४६६६.९०	
४.	मजुवा पिपलपाटा किसिकोट सडक स्तरउन्नति योजना ८	४८६२६८२	३५७६५९५.२०	७०	३५०,०००/-	
५.	हिमालय नि.मा.वि भवन निर्माण ५	५३९९६०६.२९	५३९९६०६.२९	९५	१९,५०,०००/-	उ.स.
६.	दिब्रुङ्ग शिवालय मन्दिर आवास निर्माण १	५३९२८४६.५८	५३९२८४६.५८	६०	२४,००,०००/-	उ.स.

एकभन्दा बढी पटक ठेक्का सम्झौता भई काम भएकोमा पहिलो सम्झौताको रकम मात्र

(ख) सशर्त अनुदान

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	असार मसान्तसम्म खर्च हुन सक्ने रकम	हालसम्म आयोजना /कार्यक्रमको प्रगति		कैफियत
				भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति रु.	
१.	मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	६००००००	६००००००			
२.	झरना युवाकलव सामुदायिक भवन निर्माण चन्द्रकोट ६	८००००००	८००००००	१००	८,००,०००/-	
३.	झारखर्क महिला भवन निर्माण चन्द्रकोट ३	१०००००००	१०००००००	३०		
४.	रेमि सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निर्माण चन्द्रकोट ४	१०००००००	१०००००००	३०		
५.	सुधारशिल आमा समुह भवन निर्माण उपल्लो तुराङ्ग चन्द्रकोट ८	१०००००००	१०००००००	२०		
६.	हरेवाखोला तटबन्ध योजना	६००००००	६००००००	१०		




(Handwritten signature)

	चन्द्रकोट ६					
७.	किटेनि खानेपानि आयोजना चन्द्रकोट ५	८००००००	८००००००	१००	८,००,००००/-	
८.	भण्डारथुम खानेपानि आयोजना चन्द्रकोट ७	८००००००	८००००००	२०		
९.	वलिवाङ्ग बजार क्षेत्र ढल निकास कार्यक्रम चन्द्रकोट २	५००००००	५००००००	१०		
१०.	दिब्रुङ्ग दह पर्यटन पुर्वाधार विकास कार्यक्रम चन्द्रकोट १	८००००००	८००००००	१०		
११.	सरस्वति मा वि खेल मैदान निर्माण चन्द्रकोट २	७००००००	७००००००	१०		

(ग) विशेष अनुदान

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	असार मसान्तसम्म खर्च हुन सक्ने रकम	आयोजना / कार्यक्रमको प्रगति		कैफियत
				भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति रु.	
१.	ग्वाघा मा.वि. भवन निर्माण	६०,००,०००/-	६०,००,०००/-	९५	४३,५३,०००/-	




विष्णु प्रसाद भुसाल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
